

项目现场工作周报

汇报人：崔继龙 王奎

汇报时间：2026-8-23

项目名称：临涣焦化股份有限公司新建除尘灰回配工程项目

一、本周工作内容（8月17日--8月24日）

8月17日（星期一）：（晴 24° C-30° C，风力2级）： 出勤人数4人（管理2人劳务2人工），工作时间（8小时）5:30~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）；

施工内容：1、上午料仓进料测试，粗料输送不进仓，料粉太粗；2、下午设备系统下料调试；3、上料管道改装完成，明早进中灰测试。

消缺事项：厂方打灰车进粗灰料，罐车输送无法进料，甲方要求整改，整改上料管道（减少管道弯头数量，降低上料高度），明早等候测试。

8月18日（星期二）：（晴 24° C-32° C，风力2级）： 出勤人数4人（管理2人劳务2人工），工作时间（8小时）5:30~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）；

施工内容：1、进料测试2车，细灰进仓顺利，粗灰（粗灰中的细粉）压力值超0.18，过压力值；2、下午出灰调试不成功，搅拌机下料口堵料；3、早晨西侧破碎路面清理完成，打灰延后至明早。

消缺事项：厂方打灰车进粗灰料，罐车输送无法进料，甲方要求整改，整改上料管道（减少管道弯头数量，降低上料高度），粗灰上料不成功。

8月19日（星期三）：（晴 25° C-32° C，风力2级）： 出勤人数4人（管理2人劳务2人工），工作时间（8小时）5:30~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）；

施工内容：1、现场围挡清理退租，下午围挡外运；2、下午，下料出灰调试，搅拌机下料口堵料；3、早晨西侧破碎路面浇筑地面，地面恢复完成；4、电控设备需要与甲方皮带机联动，上午布线，下午链接完成。

消缺事项：厂方打灰车进粗灰料，罐车输送无法进料，甲方要求整改，整改上料管道（减少管道弯头数量，降低上料高度），粗灰上料不成功。沟通后，甲方还是要求出整改办法，减少弯头和路径，确保粗料上料正常，粗料样本已邮寄回公司。

8月20日（星期四）：（中雨 25° C-30° C，风力2级）：出勤人数4人（管理2人劳务1人工），工作时间（8小时）5:30~11:30，是否加班（否），是否窝工（否）；

施工内容：1、上午清理现场垃圾，场地清理完成；2、上料管道整改方案，竖向管道从南侧移动到北侧，减少1处弯头，水平路径缩短5米；3、电气工程师给车间做电控操作培训；4、预约登高车和吊车。

消缺事项：周二厂方打灰车进粗灰料，罐车输送进料14.9吨（期间进料输送压力超过安全值0.18mpa，一车料分3次输送进仓），甲方要求整改，整改上料管道（减少管道弯头1处，缩短输送路径）。

8月21日（星期五）：（晴 26° C-32° C，风力2级）：出勤人数4人（管理2人劳务2人工），工作时间（8小时）5:30~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）；

施工内容：1、设备下料调试半日；2、上料管道整改方案，竖向管道从南侧移至北侧，下料做管道支架；3、资料对接要求，纸质2份，电子版1份，格式按软件做，版式不许改动；4、登高车和吊车报备。

消缺事项：周二厂方打灰车进粗灰料，罐车输送进料 14.9 吨（期间进料输送压力超过安全值 0.18mpa，一车料分 3 次输送进仓），甲方要求整改，整改上料管道（减少管道弯头 1 处，缩短输送路径）。

8 月 22 日（星期六）：（晴 25° C-30° C，风力 2 级）： 出勤人数 4 人（管理 2 人劳务 1 人工），工作时间(8 小时)5:30~11:30，是否加班(否)，是否窝工(否)；

施工内容：1、上午下料调试半日；2、报备的吊车因事不能到场，车间取消周六周日作业票，让改至周一作业；3、让工人周末休息 1 日，工人不同意，下午自动离场 2 人； 4、项目资料修改，进度 30%。

消缺事项：周二厂方打灰车进粗灰料，罐车输送进料 14.9 吨（期间进料输送压力超过安全值 0.18mpa，一车料分 3 次输送进仓），甲方要求整改，整改上料管道（减少管道弯头 1 处，缩短输送路径）。

8 月 23 日（星期日）：（晴 26° C-32° C，风力 2 级）： 出勤人数 2 人（管理 2 人劳务 0 人工），工作时间(8 小时)5:30~18:30，是否加班(否)，是否窝工(否)；

施工内容：1、劳务队在联系新人员返场； 2、周日厂区管控，动火作业禁止；3、项目资料修改，进度 80%。

消缺事项：管道二次整改已确定，但受厂区手续限制和劳务队人力离场（2 人周六下午离场）影响，要延后至下周办理。

二、目前整体情况：

1、施工现场人员：目前现场共计 4 名施工人员，具体情况如下：

序号	班组	本周（名）	预计下周（名）	备注
1	管理人员	2	2	
2	土建施工人员	0	0	

3	钢构施工人员	2	2	
总数		4	4	
备注：劳务本周离场 2 人。				

2、施工机械使用情况：

序号	设备名称	型号规格	本周 (台班数量)	下周 (台班数量)	备注
1	吊车	25 吨	0	1	
2					
3					
备注：					

3、现场施工安全管理情况：


	内容
本周安全生产情况	无安全事故发生
本周安全教育情况	早班会安全教育 6 次
本周安全检查情况	机械作业安全检查 0 次
下周安全监督管理重点	机械作业安全检查 0 次
下周安全活动计划	早班会安全教育 7 次

现场相关施工照片及说明：





周一罐车上料测试（粗料超过安全值 0.18mpa）

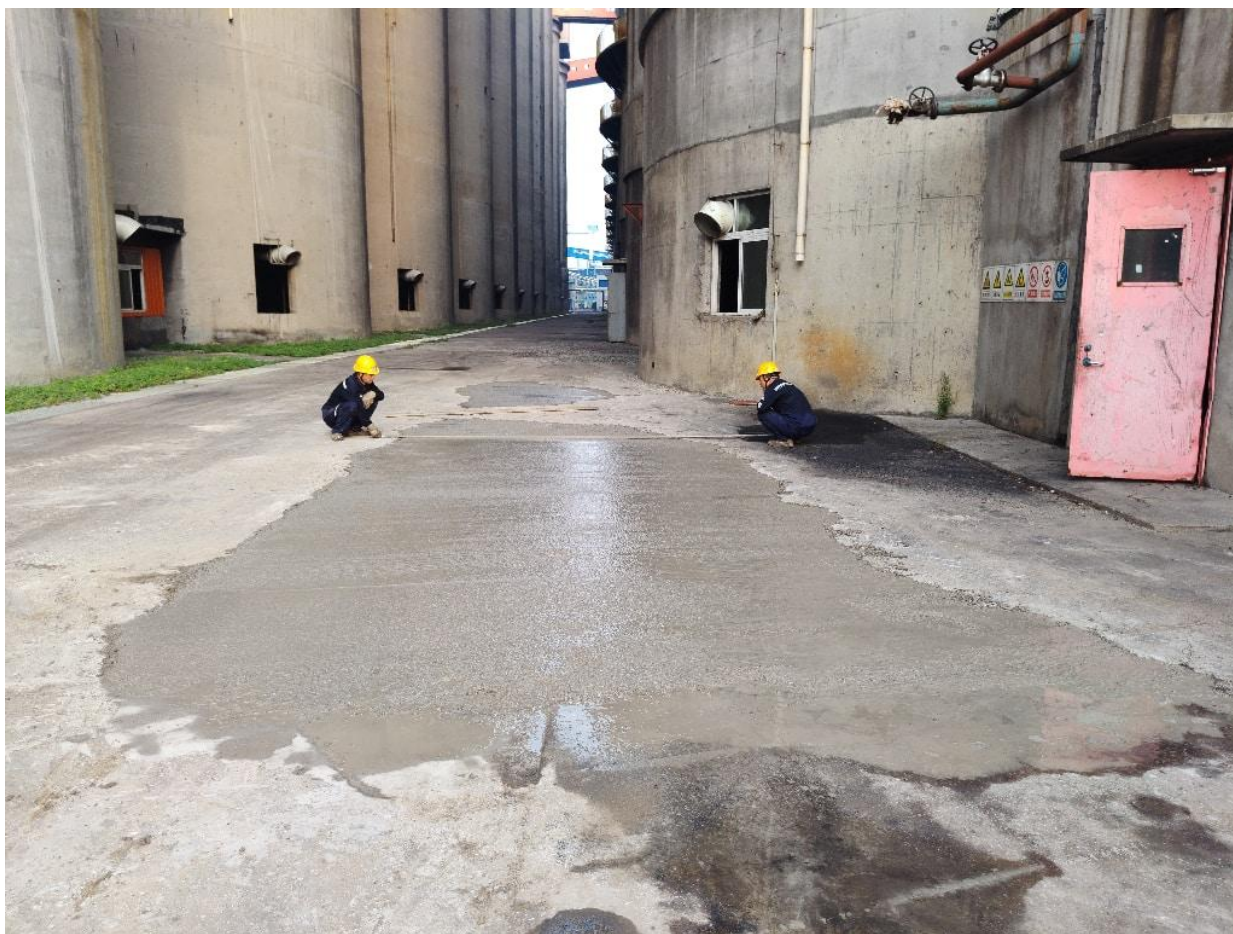

场地西侧损坏地面恢复



项目临建围挡已拆除

现场情况汇总：

- 1、人员情况：本周作业人员 2 人，清理现场、配合调试；
- 2、进度情况：本周下雨 2 天，作业 4 天，破损地面修复、围挡拆除退租、工具外运、垃圾清理；

3、合同工期：施工节点正常完成。

4、材料情况：商混采购 4 方，用于地面恢复。

5、主要问题：上料管道整改后，周一测试（粗灰）上料时，罐车气压超过安全值（0.18mpa）；甲方提出二次整改要求，上料管道从南侧移至北侧，管道弯头再减少 1 处。

另，下料调试中，加湿搅拌机与电动三通连接处，出现多次堵塞，甲方项目负责人提出增加防范措施，在此处增加 2 个振动电机（厂方提供）。

下周计划：

1、上周资料已对接完成，下周修改后提交甲方签字；

2、上料管道二次修改和振动器安装 2 件，安排人员和机械修改处理；

3、电控调试和培训；

4、安排劳务人员进场和退场；

5、设备下料调试水灰配比。

汇报人：崔继龙、王奎

2026 年 8 月 23 日
