

项目现场工作周报

汇报人：李鲲鹏 黄晓冬

汇报时间：2026-7-19

项目名称：北方稀土（包头）料仓与计量输送系统项目

一、本周工作内容（7月13日--7月19日）

7月13日（星期一）：（晴 18° C-31° C，风力2级）：出勤人数12人（管理2人，劳务10人工），工作时间（9小时）7:00~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）。

机械：25吨汽车吊

施工：1、拼装焊接锥体最后一段（完成95%），焊接锥体环梁位置，现场槽钢打磨刷漆 2、参加业主/监理例会，提出严把质量关，保证工期进度；3、班前会召开，强调吊装、动火、有限空间作业注意事项。

7月14日（星期二）：（阴 21° C-29° C，风力2级）：出勤人数12人（管理2人，劳务10人工），工作时间（9小时）7:00~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）。

施工：1、锥体环梁位置放线、打磨，筋板焊接，槽钢打磨刷漆；2、安装焊机芯片，厂房安全部要求，劳务自费；3、约谈劳务负责人，对后续现场工作

提出要求；4、班前会召开，强调动火作业注意事项，重点强调现场文明施工及穿戴问题。

7月15日（星期三）：（晴 18° C-33° C，风力2级）：出勤人数11人（管理2人劳务9人工），工作时间（9小时）7:00~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）。

机械：25吨汽车吊

施工：1、焊接料仓环向钢板，锥体环向底板；2、现场材料转场，首钢建设需要使用；3、再次约谈现场负责人，要求增加除锈刷漆工人；4、参加业主工程例会；5、召开班前会，强调动火、吊装作业注意事项。

7月16日（星期四）：（小雨 18° C-27° C，风力2级）：出勤人数12人（管理2人劳务10人工），工作时间（9小时）7:00~18:30，是否加班（否），是否窝工（否）；

施工：1、现场锥体环梁腹板焊接，焊接质量有明显提升；2、现场槽钢打磨刷漆；3、下午转运材料完成，场地已移交首钢建设；4、下发质量、安全整改单；5、召开班前会，强调动火作业注意事项，整改现场电缆。

工期：根据现场情况，7月31日完成罐体安装已难达成，现场已要求劳务抓紧人员增加，追赶进度。

7月17日(星期五):(多云 16° C-32° C, 风力2级): 出勤人数13人(管理2人劳务11人), 工作时间(9小时)7:00-18:30, 是否加班(否), 是否窝工(否)。

机械: 25吨汽车吊

施工: 1、锥体环梁位置加固焊接, 槽钢、钢板除锈刷漆; 2、对现场工人交底焊接、打磨、刷漆工作提出要求; 3、办理人员进场证件手续; 4、参加业主工程例会, 要求上报设备进场计划; 5、班前会强调吊装、动火注意事项。

材料: 已对接公司物流部, 格栅材料已发货。

7月18日(星期六):(晴 21° C-30° C, 风力2级): 出勤人数12人(管理2人劳务9人), 工作时间(9小时)7:00~18:30, 是否加班(否), 是否窝工(否)。

机械: 25吨汽车吊

施工: 1、环梁筋板、腹板拼装焊接2个罐, 库顶板开始加工拼装; 2、下发工程联系单1份, 提出工期要求, 人员要求; 3、清退现场普工1人; 4、监理巡查工地, 强调现场除锈质量; 5、班前会强调吊装、动火注意事项。

材料: 下午进场楼梯镀锌格栅板, 共计142块, 现场已核实, 随车附带相关资料。

7月19日(星期日): (雨 18°C-32°C, 风力3级): 出勤人数11人(管理2人劳务9人), 工作时间(9小时)7:00~18:00, 是否加班(否), 是否窝工(否);

机械: 25吨汽车吊

施工: 1、罐体库顶拼装焊接, 焊接环梁腹板, 格栅钢梯拼装焊接, 支架立柱除锈; 2、参加业主工程例会, 要求加快进度; 3、再次约谈现场负责人, 增加人员; 4、召开班前会, 强调动火、吊装注意事项。

材料: 已跟公司相关部门对接, 第一批非标件及设备24号发货。

其他情况: 下发通知单, 要求劳务增加施工人员至17人, 保证31日罐体吊装安装完成节点; 下发质量通知单, 要求劳务增强质量管控意识, 目前已将现场实操能力差的工人清退。

二、目前整体情况:

1、**施工现场人员:** 目前现场共计11名施工人员, 具体情况如下:

序号	班组	本周(名)	预计下周(名)	备注
1	管理人员	2	2	
2	钢构施工人员	8	12	
3	普工	3	5	
总数		13	19	
备注: 本周清退一人				

2、施工机械使用情况:

序号	设备名称	型号规格	本周(台班数量)	下周(台班数量)	备注
----	------	------	----------	----------	----

1	汽车起重机	25 吨	5	7	
2					
3					
备注;					

3、现场施工安全管理情况:

	内容
本周安全生产情况	无安全事故发生
本周安全教育情况	早班会安全教育 7 次
本周安全检查情况	机械作业安全检查 2 次
下周安全监督管理重点	机械作业安全检查 2 次
下周安全活动计划	早班会安全教育 7 次

现场相关照片及说明：




锥体现场拼装焊接



锥体环梁现场拼装焊接



罐体库顶现场拼装焊接

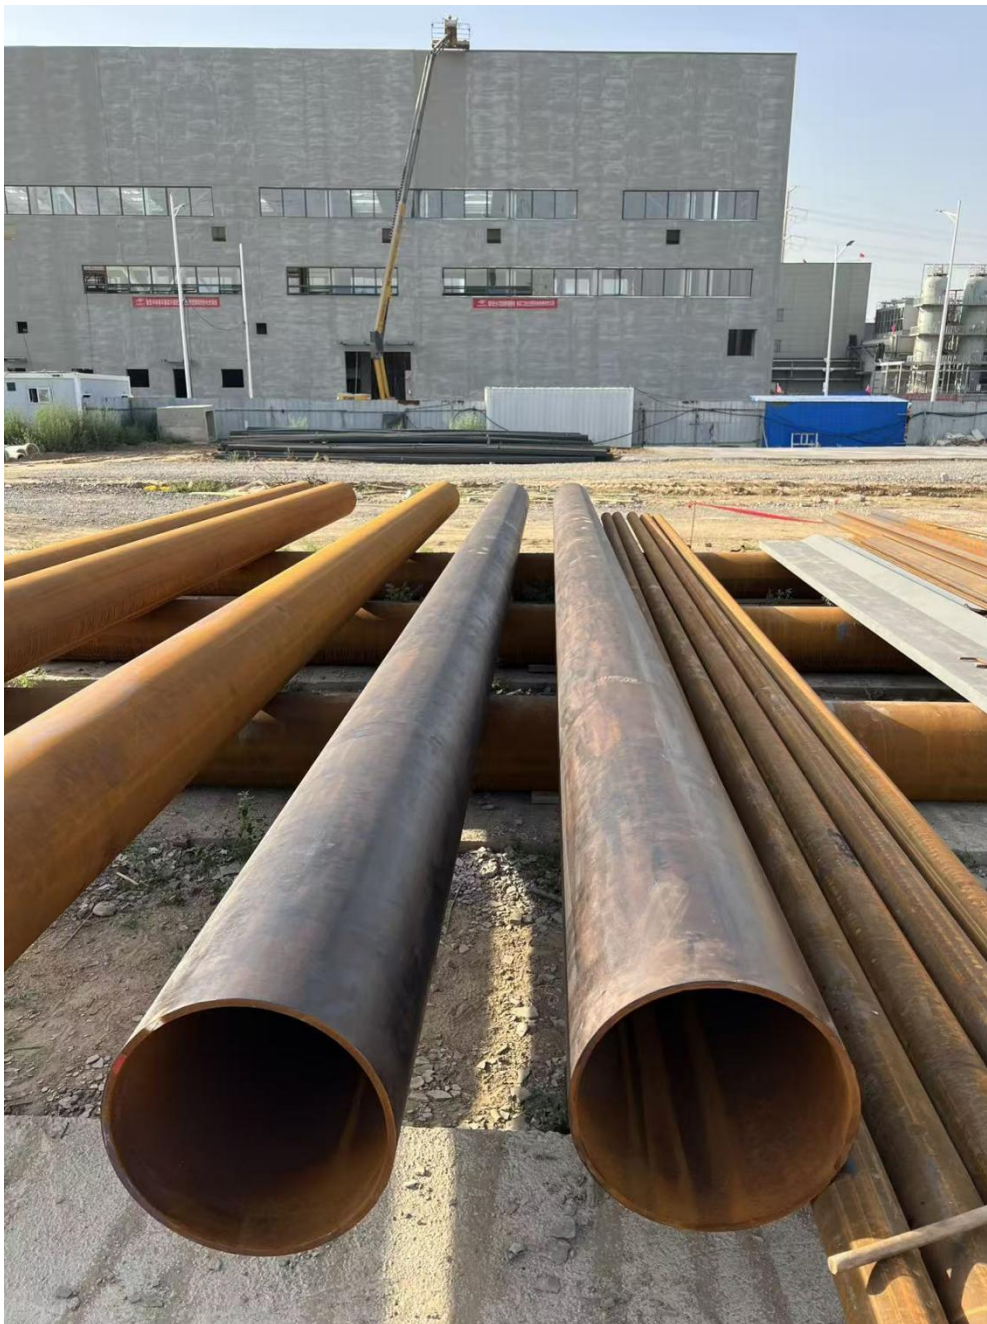

现场刷漆前除锈



现场格栅踏步楼梯制作

现场情况汇总：

- 1、人员情况：本周进场 11 人，清退 1 人，作业 7 天，后续人员还在联系中；
- 2、进度情况：两个锥体拼装焊接完成 100%；两个环梁拼装焊接完成 65%、1 个库顶拼装完成 60%、钢梯拼装焊接完成 15%；
- 3、合同工期：项目完成节点时间在 9 月 1 日（根据业主审批的开工报告），现场施工人员至少 17 人，才能保证节点时间（已下发通知单）。

4、材料情况：料仓及钢结构原材、钢梯镀锌格栅已到货。

5、剩余主要工作：料仓库顶、仓壁的拼装焊接、料仓支架制作安装、钢梯的制作安装、构件的除锈防腐、设备合电控的安装。

下周计划：

1、钢梯安装完成 20%；料仓支架安装完成 30%；2 个料仓库顶拼装完成 85%、仓壁拼装焊接完成 50%；

2、督促劳务队继续增加人手（6 人）；

汇报人：李鲲鹏 黄晓冬

2026 年 7 月 19 日
