

2026年6月份经营汇报

汇报人：杨超

部门：总经办

日期：2026年6月29日



目录

CONTENTS

01

全年四大核心任务完成情况

02

项目打单及执行进展情况

03

公司标准化流程搭建



年度四大核心任务-年度目标完成情况-6月份重点临签项目




- 6月份新增签约项目3个，签约金额1204万。均被国际业务部1组斩获，分别是**蒙古厂房设计项目（251万、陈子凡）**、**菲律宾Davao2*150淀粉仓（422万、陈子凡）**、**菲律宾Cebu4*180T淀粉仓（531万、张硕）**。
- 7月份重点临签项目**2个**，预计签约金额**1235万元**，需保障7月份落地，实现预付款到账：
 - **马鹏飞-菲律宾XXX项目（400万）** --业主计划分批采购，正与业主协商合并采购；**国内项目李永祥XX项目（835万）** --因资质问题，项目拆分3个标段，并通过兜底协议，保障整体签约金额，预计7月上旬获取中标通知书。
 - 公司**战略项目**7月份重点工作：**缅甸项目项目铁三角（司斌、赵巧义、曹杨、李刚）**，目前项目已无驻留人员，**司斌计划7月中旬再次赴项目沟通。**

2026年公司累计签约项目

序号	部门	组别	业务员	项目名称	人民币金额 (万元)	月份	部门
1	国际业务部	二组	司斌	缅甸配件	1.14	202601	国际业务部
2	国际业务部	五组	陈辉	斯里兰卡4x2000吨水泥仓项目（USD1723000）	1212.50	202601	国际业务部
3	国际业务部	六组	韩鸿彪	越南QNC4x6000T螺旋卷边仓项目(USD1338000)	994.18	202602	国际业务部
4	国内业务部	/	李永祥	临涣焦化新建除尘灰回配工程项目（RMB4148500）	414.85	202603	国内业务部
5	国内业务部	/	李永祥	阿尔及利亚炭黑颗粒仓及储罐项目（USD1750000）	1207.50	202603	国内业务部
6	国际业务部	一组	陈子凡	蒙古热风管道改造项目（USD169797）	117.16	202603	国际业务部
7	国际业务部	六组	韩鸿彪	越南4x6000T卷边仓项目配套提升机项目	156.35	202605	国际业务部
		一组	陈子凡	2*150			
8	国际业务部	一组	陈子凡	蒙古厂房设计项目	251	202606	国际业务部
9	国际业务部	一组	陈子凡	菲律宾Davao2*150淀粉仓	422	202606	国际业务部
10	国际业务部	一组	张硕	菲律宾Cebu4*180T淀粉仓	531	202606	国际业务部

年度四大核心任务-国家级专精特新“小巨人申报”-申报程序（工信部）

- 2026年3月23日工信部办公厅发布《关于开展 2026 年度专精特新“小巨人”企业认定和复核工作的通知》，对申报程序更新如下：
- 工信部已于**4月25日**开放线上申报端口，**5月14日**第三方已完成申报材料盖章提报，5月22日补充专利资料后线上进行二次申报；
- 6月25日，公司已由河南省工信厅**成功推荐至国家工信部**（郑州推荐名单序号10），并挂网公示。本次河南省推荐企业**123家企业（郑州29家）**，入围数量基于优中选优原则，较**去年205家，减少82家，精简40%**。依据往年数据预测，河南省推荐企业中**30%-40%比例（40-50家）**将最终获取国家级专精特新“小巨人”称号。



年度四大核心任务-国家级专精特新“小巨人申报”-长期布局事项



- **省级企业技术中心**：预计8月申报（2026年申报通知暂未下达，工信主管），已于6月25日约谈第三方杨老师，当前按照评价资料自评得分**约65分**（标准线60分），但是**前提**需解决硬性条件：**研发设备原值800万以上（当前200万）、研发人员50人以上（当前38人）。**
- **省级重点研发项目**：预计8月申报，目前结合技术总工及研发部相关项目推进。
- **发明专利**：6月25日第三方企知道咨询公司已对**公司技术总工及研发部**做了**专利管理培训**，后续结合研发项目同步推进。
- **河南省专利奖**：第六届河南省专利奖还未公示。
- **核心风险只有一个**：**过度依赖外部机构和单一人脉**——必须转向**内部主导、多点并行、设置备选方案**的推进模式，确保任何一个外部渠道断裂都不会拖垮全局。

专精特新“小巨人”申报					
序号	失分项	分值影响	2027年行动要点	责任部门	截止节点
1	发明专利（I类>=4项）	硬性门槛缺失，直接导致省厅大概率不推荐；集成电路布图能否5月25日前获证是唯一决定性变量	1. 跟进3项集成电路布图授权进度 2. 启动2项新发明专利申请（气固两相流、相变控温方向） 3. 建立专利年度滚动布局机制	法务部	2026年12月前完成布局
2	省级企业技术中心	失去8分，仅得自建4分，差额-4分；同时失去知识产权门槛豁免资格	1. 对杨俊年发出最后期限 2. 引入第二家咨询机构形成竞争 3. 补强固定资产（设备并购/转移） 4. 评估与高校共建路径	财务部	2026年8月前完成申报
3	河南省专利奖	知识产权质量项（满分10分）缺乏高价值专利支撑，间接影响得分上限	1. 结果公布后立即以核心发明专利参评下一届 2. 优先推报与高校合作的核心发明专利 3. 委托中介协助参评材料准备	研发部	2026年内提交参评材料
4	省级科技进步奖	失去知识产权门槛豁免通道；技术先进性佐证薄弱，创新能力整体说服力打折	1. 联合郑大/河南工大以“相变控温储粮”“气固两相流”成果联合申报 2. 签订共研协议并明确署名顺序 3. 关注中国机械工业协会等行业奖项	研发部	2026年底确定合作方向
5	河南省重点研发专项	无直接计分项，但研发能力整体佐证薄弱，创新能力维度说服力不足	1. 切断单一联络人依赖，直接接触河南工大粮食工程学院教授团队 2. 以智能储粮/气固分离方向申报，结合AI方向提升竞争力 3. 将项目成果与专利、科技奖励申报联动规划	研发部	2026年9月前完成预对接
6	国家标准参编（粮食方向）	质量管理水平加分（3分）本届无法兑现；粮食/水泥领域错配风险仍在	1. 向归口单位索取立项文件作过渡性佐证 2. 确认16个月编制周期公示节点能否赶上2027年窗口 3. 同步推进粮食方向行业标准参编作备份	研发部	2026年底前确认里程碑

年度四大核心任务-企业钢结构及机电资质升级-申报程序（住建部）

第一阶段：资料准备
当前进行中

- 现在~5月底
- 制定**缺口建造师（机电2人，建筑2人）**和**2名专业高级职称人员**引进时间表，确保7月申报前满足3个月连续缴纳社保要求
- 最晚4月30日-硬性截止
- 所有新增申报人员开始在本公司缴纳社保，若计划7月申报，4月1日是社保起缴的绝对截止日。

第二阶段：材料准备与申报
5-7月份

- 5月
- 委托会计师事务所出具2025年度财务审计报告，需出具正式审计文件
- 5月~7月 完成业绩材料全套整备
- **境外业绩所有外文材料协调业主盖章**
- 7月底 材料终审节点
- 全套材料内部终审，确认达到提交条件；
- 目标7月 登录河南省政务服务网，正式提交申请

第三阶段：审核与认定
8-10月份

- 7~8月
- 河南省住建厅受理，整理材料推送至住建部
- 8~9月
- **住建部组织专家最终审核** & 可能进行随机实地抽查；务必保持申报人员实际在岗，资料随时备查
- 8~9月
- 公示与公告

年度四大核心任务-企业钢结构及机电资质升级-材料准备

- 资质升级申报材料**共计12项，已完成7项，待完善5项**，其中：
 - 第8项**"技术负责人（机电）"**：需引进机电工程相关专业高级职称人员（**行政部**）
 - 第9项**"技术负责人（钢结构）"**：需引进钢结构工程相关专业高级职称人员（**行政部**）
 - 第10项**"注册建造师"**：引进**机电专业一建2人，建筑工程专业2人**并开始缴纳社保（**行政部**）
 - 第11项**"质量管理体系认证"**：**已于6月4日获取电子版证书。**
 - 第12项**"企业工程业绩"**：需按照资质升级要求，完成项目业绩资料准备（**行政部**）--**中标通知书、合同、业绩真实性证明、竣工验收证明、结算单、商务部备案文件**

1.资质申请表

登录系统在线打印

2.营业执照副本

有效期内，需公章

3.机电二级证书

正副本，确认有效期

4.钢结构二级

正副本，确认有效期

5.安全生产许可证

需覆盖整个审批周期

6.企业承诺书

法定代表人签字盖章

7.审计报告

已出具

8.技术负责人 (机电)

无此人员，待引进

9.技术负责人 (钢结构)

无此人员，待引进

10.一级建造师 (机电)

机电3人，建筑4人

11.质量管理体系 认证

复审

12.企业工程业绩

待补充

年度四大核心任务-企业钢结构及机电资质升级-业绩要求



根据现有资料综合来看，此次资质升级工作的核心卡点在于工程业绩的落实。机电方面要求近5年内有2项单项合同额2000万元以上的总承包业绩，钢结构方面要求近5年内有符合5类标准中至少2类的钢结构工程业绩。

公司项目业绩											
序号	申报类型	项目名称	年度	业务经理	合同性质	工程设计	生产制造	质量检验	包装及运输	施工及验收	合同金额（万元） (RMB)
1	机电升级	菲律宾达沃项目	2021年	曹总	EPC	已完成	已完成	已完成	已完成	已验收	4481.11
2	机电升级	乌兹别克碳酸钙筒仓项目	2024年	崔阳	EPC	已完成	已完成	已完成	已完成	已验收	4640.00
3	钢结构升级	蒙古16.7万吨熟料料场系统项目	2024年	陈子凡	供货	已完成	已完成	已完成	已完成	中度逾期	3971.65
			2024年	陈子凡	安装	已完成	已完成	已完成	已完成	中度逾期	2128.39
4	钢结构升级	拉法基豪瑞孟加拉驳船装载输送系统项目	2023年	--	EPC	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	1077.33

年度四大核心任务-企业钢结构及机电资质升级-业绩要求



- 机电资质升级--（近5年承担过单项合同额 2000万元以上的机电工程施工2项）



国家 菲律宾
COUNTRY PHILIPPINES

客户 生力集团
CLIENT SMC

仓 型 大型焊接式钢板仓
SILO TYPE Large Welded Steel Silo

存 储 物 料 水泥、熟料
STORED MATERIAL Cement, Clinker

项 目 包 含 焊接式钢板仓、配套钢构、设备、电气系统集成 EPC。
PROJECTS INCLUDE Welded steel silos, Equipped with steel structure, Equipment, Electricity system integration EPC.

该项目是目前中国企业对外承包储量最大的单体工业建材项目之一。
The project is currently one of the largest single industrial building materials projects in terms of services contracted by Chinese enterprises to foreign countries.



国家 乌兹别克斯坦
COUNTRY UZBEKISTAN

客户 CEMIX
CLIENT

存 储 物 料 碳酸钙颗粒
STORED MATERIAL Calcium Carbonate Pellets

仓 型 装配式钢板仓
SILO TYPE Bolted Steel Silo

项 目 包 含 装配式钢板仓仓群、磨机、物料输送、筛分、存储包装、全场自动化、信息化系统、EPC工程项目
PROJECTS INCLUDE Bolted steel silo, Mill, Material conveying, Screening, Storage and packaging, Full automation, Informationization system, EPC engineering project

资质升级项目申报材料进度汇总

项目	中标通知书	合同 (协议书+专用条款)	竣工验收证明	结算单	业绩真实性证明	合同翻译
菲律宾达沃项目	已有，待盖章	已有，待盖章	已有，待盖章	已有，待盖章	已有	已完成
乌兹别克碳酸钙项目	已有，待盖章	已有，待盖章	已有	已有，待盖章	高风险 需大使馆参赞处出具	已完成
备注	已电话沟通乌兹及蒙古大使馆，目前要求先在商务厅备案后才能办理，行政部已对接商务厅赵老师，答复需要补缴300万保证金且前序工程无法补签业绩真实性证明。中国驻外使领馆不直接出具“工程真实性证明”，但境外工程项目若用于国内资质申报，常需驻外使领馆经商处（非大使馆领事部）出具相关证明；而该类工程的备案，属于商务主管部门（商务部或省级商务厅）职责，与使领馆认证程序无关					

年度四大核心任务-企业钢结构及机电资质升级-业绩要求



钢结构资质升级：近5年承担过下列5类中的2类钢结构工程的施工，工程质量合格。

- (1)钢结构高度80米以上；(2)钢结构单跨30米以上；(3)网壳、网架结构短边跨度70米以上；(4)单体钢结构建筑面积3万平方米以上；(5)单体钢结构工程钢结构重量 5000 吨以上。

蒙古16.7万吨熟料料场系统项目
(满足“网壳、网架结构短边跨度70米以上”)

国家蒙古
COUNTRY MONGOLIA

客户
CLIENT MAK

料棚顶高(m)
CANOPY ROOF HEIGHT (m)

39.5

跨度(m)
SPAN (m)

96

长度(m)
LENGTHS(m)

135

面积(m²)
AREA (m²)

12960

56米

拉法基豪瑞孟加拉驳船装载输送系统项目
(满足“钢结构单跨30米以上”)

存储物料
STORED MATERIAL 石灰石
Limestone

仓型
SILO TYPE 焊接钢板仓
Welded Steel Silo

non-bermet conveyors, cross-river corridor steel structure, as well as supporting
fixed unloading trolleys and weighing steel silos, 2 sets of ship engine systems,
dust collectors and other process equipment electronic control systems, EPC.

资质升级项目申报材料进度汇总						
项目	中标通知书	合同 (协议书+专用条款)	竣工验收证明	业绩真实性证明	竣工图 (PDF格式)	合同翻译 (中文版)
蒙古熟料料场项目	已有，待盖章	已有（使用原合同）	已有，待盖章	高风险 需大使馆参赞处出具	已有，待盖章	已完成翻译
拉法基豪瑞孟加拉项目	已有，待盖章	已有（合同调整）	已有，待盖章	高风险 需大使馆参赞处出具	已有，待盖章	已完成翻译
备注	已电话沟通乌兹及蒙古大使馆，目前要求先在商务厅备案后才能办理，行政部已对接商务厅赵老师，答复需要补缴300万保证金且前序工程无法补签业绩真实性证明。中国驻外使领馆不直接出具“工程真实性证明”，但境外工程项目若用于国内资质申报，常需驻外使领馆经商处（非大使馆领事部）出具相关证明；而该类工程的备案，属于商务主管部门（商务部或省级商务厅）职责，与使领馆认证程序无关					

待大型战略项目落地后实施

(5月25日公司已建立**专项钉钉群**，方便推进交流)

An aerial photograph of several large, cylindrical industrial silos with green corrugated metal roofs. The silos are arranged in a row, and a network of metal walkways and ladders is visible on top of them. A semi-transparent blue horizontal band runs across the middle of the image, containing the white Chinese text '校企合作'.

校企合作

- 截至2026年6月，公司校企合作工作稳步推进，已与郑州大学、河南工业大学、郑州轻工业大学共3所高校建立合作关系，涵盖揭榜挂帅项目申报、省级研发合作、国家标准参编、商务部援外培训、人才联合培养及科技奖项申报等6项具体合作事项。
- 河南工业大学：商务部援外培训工作在6与24日已与教育培训学院沟通，计划于7月10日针对非洲-莱索托政府粮食培训班，来我司进行参观考察；研发项目工作在6月25日总经办及技术总工已对接土木学院黄璜教授并考察研发实验设备，后续合作框架协议模板，需结合具体研发项目拟定。
- 郑州大学：由郑州大学承担，河南实荣为合作单位揭榜挂帅项目，省科技厅已于6月24日完成立项并挂网公示（2026年度第一批省重大产业关键技术攻关项目），纳入省重大科技专项管理。
- 郑州轻工业大学：已和郑州轻工业大学（牵头人张宽【任命为公司科技副总（兼）】）签订成立大宗散料储运智能化校企研发中心，初步确定研发中心的重点任务。
- 华北水利水电大学：已于6月26日对接土木与交通学院（钢结构与工程研究院）陈院长及崔书记，暂定于本周二前往学院考察并查看实验中心设备。
- 各项合作均已明确对接负责人，整体处于推进落地阶段。后续将以重点事项清单为抓手，定期组织专题会跟进进展，确保各合作事项有序推进、逐项落实。

校企合作清单梳理						
序号	学校名称	合作事项	具体说明	对方对接部门	我方对接部门	进展情况
1	郑州大学	揭榜挂帅	联合申报河南省重大产业关键技术攻关"揭榜挂帅"项目——"高铁物流数智化高效集疏运关键技术概念验证与应用"。	计算机与人工智能学院	研发部	推进中，合作协议已于2026年2月28日签订
2	河南工业大学	商务部援外培训	结合工大河南省唯一商务部援外培训资质，共建国际化培训体系；实荣提供讲师资源及公司参访课堂，推动培训成果向海外项目对接转化	教育培训学院（张翼）	总经办	推进中，5月19日下午前往学院对接公司考察事宜，培训合作参与方案，已完成初稿，待确认
		省级研发项目	重点围绕万吨级粮仓温湿度智能监测和钢板仓结构安全监测（高温高湿高盐雾环境下结构健康感知与预警，结合无人机智能巡检）两大方向，以此为抓手联合申报科技厅相关项目	土木学院（黄璜）	研发部	推进中，已对接产业研究院院长，对方已发框架模板，需结合具体研发项目拟定。
		国家标准起草	工大牵头起草的《粮食筒仓国家标准》，实荣参与修订并贡献工程实践经验。	土木学院（黄璜）	研发部	
		人才培养与国际平台联动	探讨面向土木、机械、机电专业的定向联合培养机制；就参与联合国粮农组织全球粮食减损会议、APEC工商峰会、链博会粮食安全国际论坛等高端国际论坛达成协同参与意向，共同构建国际影响力平台	学校办公室（刘红军）	总经办	
3	郑州轻工业大学	省级科技进步奖	联合申报省级科技进步奖，提升公司技术成果的政府认可度与行业影响力	电气学院（安晓宇）	总经办	推进中，待确定最终项目




项目打单及执行



项目打单-询盘情况



- 本两周（6月12日至6月25日）共新增客户询盘 185条（6月15日单日新增62个询盘客户），较上期（55条）大幅增长（社媒广告策略调整及展会影响），约为上期的 3.4倍，询盘节奏明显加快。
- 从地区分布看，非洲继续保持首位（89条，占48%）；东南亚15条，占8%（含菲律宾、印度尼西亚、越南等）；中东/阿拉伯16条，占9%（含约旦、阿联酋、沙特、伊朗等）；南亚32条，占17%（主要为斯里兰卡25条）；欧洲6条，占3%；俄语区/独联体5条，占3%（含哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等）；其他22条。
- 从询盘分组看，3组（王伟乐+马鹏飞）37条；6组（韩鸿彪+苗恒）36条；2组（司斌+王伟超）33条；5组（陈辉+冯乐）31条；1组（陈子凡+张硕）26条；俄语组（崔阳+尹韬越）6条，俄语区线上询盘占比持续走低。
- 公海客户二次开发已完成调研合计605个（共需调研1400个客户），累计识别有效客户占比40%。






项目打单-方案设计情况

- 2026年度已累计完成方案设计 **132个**，平均每个工作日完成 **1.03个**。
- 本两周（6月12日至6月25日）共完成方案设计 **16项**，较上期（21项）有所回落。
- 从行业分布看，**工业类11项**（占69%），**粮食类4项**（占25%），工业赛道继续占主导。
- 从版本分布看，V1首版10项（占63%），V2及以上迭代版4项（含V2、V4各2项，占25%），其中**王伟超--哥斯达黎加咖啡豆仓**已更新至V3版本。
- 从完成时效看，本期仅**1项存在逾期**，崔阳/哈萨克斯坦TOO水泥储存输送钢板仓和料斗方案（逾期0.9天），逾期数量较上期（4项逾期）明显收窄，时效管控有改善。
- 从参与人员看，**崔阳以6项遥遥领先**，王伟乐完成2项，司斌、韩鸿彪、冯乐、陈子凡、苗恒、王伟超、马鹏飞、李永祥各完成1项，参与面较上期（11位）基本持平。

技术部方案设计完成数量

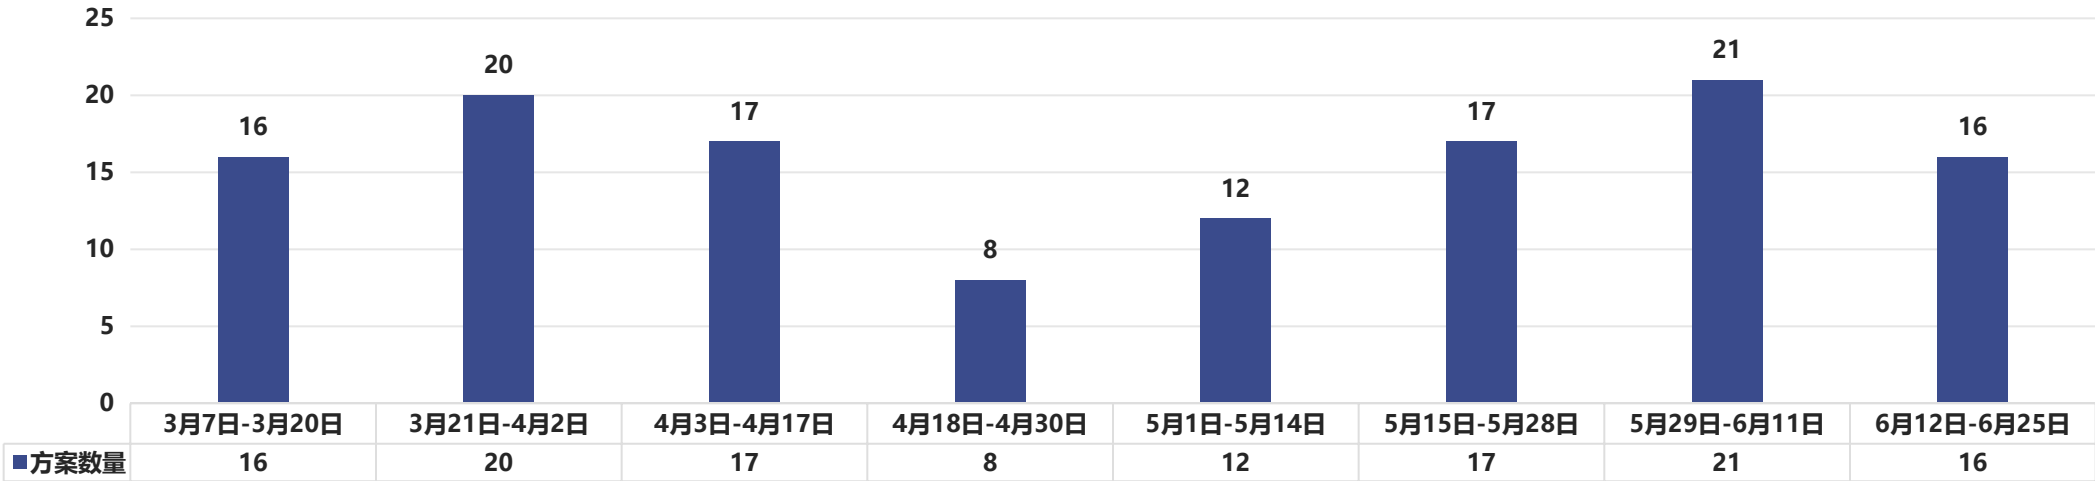

项目打单-方案设计机制实施情况

- 客户需求澄清会：由总经办组织召开（平均每天至少1个）。目前每天正常召开。
- 方案评审会：《双周项目方案评审会》已于6月17日召开，对6月5日-6月16日期间共计14个方案集中评审，无重点项目。
- 上述两个会议，要求业务组长陪同业务员参会，与本年度业务部奖金包中设置的组长辅导奖形成机制联动，将组长的传帮带职能固化到具体工作场景中，会议效果较好。
- 项目分级：双周项目方案评审会召开以来，已完成方案评审80个，其中，筛选重点项目15个（占比19%），后期与技术部建立分级审核机制，针对重点项目的迭代方案评审，一是要求方案设计完毕后当天要组织召开评审会，提升评审及时性；二是针对重点项目方案评审，技术总工要主持参会，提升评审级别。




项目报价情况




- 2026年度已累计完成报价100个，平均每个工作日完成0.78个，报价任务较去年同期基本持平（去年同期85个）。
- 本两周（6月12日至6月25日）共完成报价任务 13项，与上期（13项）持平，报价产出节奏保持稳定
- 从行业分布看，工业类10项（占77%），粮食类3项（占23%），工业赛道报价力度持续领先。
- 从版本分布看，V1首版10项（占77%），V2及以上迭代版2项（V2、V3各1项，占15%）。
- 从完成时效看，本期 2项存在逾期：崔阳/SILOS KZ粮储综合体报价V1（逾期0.1天）、陈子凡/MONCEMENT水泥中转站报价V1（逾期0.9天），逾期幅度总体较小，与上期（2项逾期）基本持平。
- 从参与人员看，崔阳以6项居首，王伟乐完成2项，韩鸿彪、司斌、冯乐、陈子凡、王伟超各完成1项；共7位成员参与本期报价工作，参与面较上期（9位）略有收窄。

报价完成数量



项目打单-报价机制实施情况

- 关于报价机制优化事宜，6月17日温总组织**业务部各组长与报价端对接人**召开《报价沟通会》，针对报价共同问题，**本周落实推动解决**。
- 任务管家：针对**方案任务及报价任务**，将分拆为两类模板，确认**前置审批人、参与人、审核人及抄送人**，明确业务员提报路径，提高任务管家管理效率。

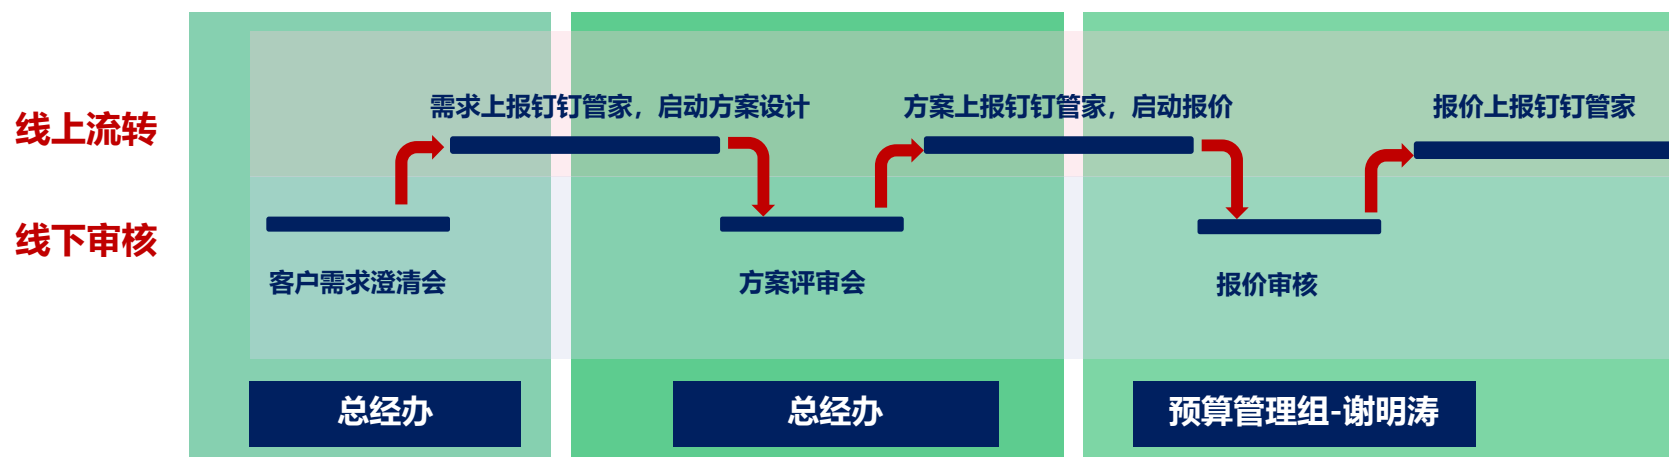

项目执行情况




- 会议跟踪
 - 项目启动会 (0个)：上两周无启动会召开；
 - 项目执行会 (1个)：双周执行会已于6月17日召开，并梳理重点工作清单，由计划运营部督办推进。
 - 优化项目执行会汇报形式，同时针对目前计划管理上问题，充分探讨论证，集思广益，以提升项目执行效率。
 - 项目专题会 (1个)：6月22日召开《临涣项目物流发货专题会》，后续总经办结合计划运营部督办推进。
- 工程进度跟踪
 - 埃及8X9000吨水泥卷边仓项目 (袁纪斌)：截至6月21日，1-8号仓已完成安装及防水测试，目前正进行仓顶平台板补焊及收尾工作。指导安装工人已于6月17日全员撤场返回国内，剩余工作转由当地工人完成。现场设备工具及框架已打包完成，待业主订船运回国内，预计本周三或周四项目负责人返回。整体项目已基本竣工，进入尾期收尾及移交阶段。
 - 巴基斯坦SECMC铁路装车站项目 (曹明刚)：截至6月21日，现场劳务进一步扩充至237人，白夜班16小时连续作业。本周主要完成装车楼BPB02基础筏板钢筋绑扎、TF0/TF0a基础回填及地脚螺栓安装、水平段支架基础混凝土浇筑等工作。第一批货物6月16日已发货，业务经理张硕及工程部经理李刚已达项目现场，协调款项支付及现场进度问题。整体土建仍处于追赶进度阶段，钢结构及机电安装尚未启动，进度风险仍需高度重视。
 - 蒙古新2X7000T水泥仓系统项目 (项目经理：李亚超)：截至6月21日，1#筒仓卷边仓持续推进，螺旋提升至约10米；2#筒仓二层结构混凝土已于6月18日夜间加班浇筑完成；火车坑斗提机地下室剪力墙、框架柱钢筋持续安装，外脚手架搭设中。整体仍较计划滞后，本周将启动提升机塔架钢构件组对拼装，需持续关注大风天气对吊装作业的影响。
 - 淮北临涣焦化除尘灰回配项目 (项目经理：崔继龙)：截至6月21日，搅拌机、螺旋秤、罗茨风机等设备已陆续到货，本周踏步钢格栅已发货，保障现场连续施工。
 - 北方稀土 (包头) 料仓和输送系统项目 (项目经理：李鲲鹏)：已于6月10日完成施工技术交底，当前已组织进场施工。



项目执行情况



- **蒙古料场项目已于6月20日顺利获取竣工验收报告，获取业主对公司的认可和好评；另外，埃及8*9000项目筒仓部分已于6月16日完成竣工，后续工程部需及时组织复盘会。**

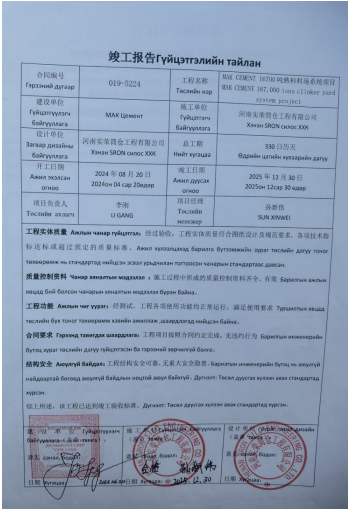

蒙古料场项目已于6月20日完成竣工验收



埃及8*9000项目筒仓部分已于6月16日完成竣工





项目执行情况--应收账款专项



- 截至目前，公司共有**国外项目15个**、**国内项目8个**存在**质保金未回收情况**，合计**应收2,008万元**（国外1228万，国内780万）。
- 从国外项目看，未收质保金集中在菲律宾、蒙古、乌兹别克斯坦、马来西亚等市场，**业务员以陈子凡为主**。未回收原因主要**一是业主已完成安装但处于试运行阶段，设备存在问题待解决后申请；二是业主同意回款但需公司配合开具质保保函**，此类项目需尽快推进保函开具手续；**三是项目完工但业主未启动验收或长期未回复**。
- 从国内项目看，未收质保金业务员**以李永祥为主**。其中中国电建华东院**三亚石料矿项目未收金额最大**（约426.94万元，占比55%），回收难度较高；
- 解决措施：**一是需开具质保保函的项目加快内部审批流程，尽快解锁回款；二是对长期失联或存在争议项目启动法律手段，加快资金回笼，财务收集证据计提坏账。**

质保金--应收账款催收									
序号	项目类别	项目	合同日期	合同金额 (CNY)	剩余回款	未回款比例	进度	业务员	跟进措施
1	国外项目	巴基斯坦煤炭转运仓	2021/1/22	11,445,000.00	1,144,500.00	10%	质保金	陈子凡	2023年3月份完工，与总包方Gasco签订，Gasco拖延不回复，无有效催收手段，建议法律诉讼
2	国外项目	菲律宾4套饲料颗粒仓	2021/5/24	17,172,350.44	1,717,235.04	10%	质保金	陈子凡	验收报告已于2025年获取其中2套颗粒仓的报告，针对这两套颗粒仓，业主同意我方开具质保保函后付款，另外两套仓因设备未投用，项目经理拒绝办理验收手续。
3	国外项目	乌兹4×1500T磷矿粉项目	2021/10/16	24,186,700.00	2,418,670.00	10%	质保金	曹总	EP业主自行安装，签订安装合同未执行，完工未运行，尹韬越原联系人离职，暂无人联系。
4	国外项目	菲律宾2座万吨仓修复项目	2022/7/6	3,031,529.69	303,152.97	10%	质保金	陈子凡	业主去年同意验收并付款，但后续因高电缆信号问题导致软件过期，属供货质量问题，电气已在现场处理，待解决后即可申请质保金；合同约定调试完成后12个月
6	国外项目	菲律宾4套万吨玉米仓配套设备	2022/8/15	10,257,651.46	1,025,765.15	10%	质保金	陈子凡	业主方已完成安装，试运行阶段，设备存在问题，正在解决，之后处理质保金；合同约定调试完成后12个月
12	国外项目	菲律宾MG8港口吸粮机	2023/11/7	5,696,600.00	569,660.00	10%	质保金	陈子凡	业主方已完成安装，试运行阶段，设备存在问题，正在解决，之后处理质保金；合同约定调试完成后12个月，袁继斌去整改
8	国外项目	菲律宾卸粮坑发放仓设备	2023/5/10	479,725.75	47,972.58	10%	质保金	陈子凡	业主方已完成安装，试运行阶段，设备存在问题，正在解决，之后处理质保金；合同约定调试完成后12个月
7	国外项目	蒙古16×200m³面粉装配仓项目	2023/3/23	4,650,373.00	232,518.65	5%	质保金	陈子凡	项目安装完成，未完成调试，待完成调试后付款
5	国外项目	菲律宾平房仓顶及设备项目	2022/7/26	2,144,743.37	214,474.34	10%	质保金	陈子凡	业主方没有完成安装，未投产，合同约定调试完成后12个月
9	国外项目	乌兹ENTER拆包机项目	2023/6/7	12,828,146.51	1,120,100.43	9%	质保金	-	
10	国外项目	蒙古2*7000T水泥仓项目	2023/8/24	325,166.40	1,814,400.00	10%	质保金	陈子凡	业主方优先保障执行中项目付款，此笔可后续逐步回收。
11	国外项目	蒙古2*7000T水泥仓项目-增补钢构及施工	2024/8/8	327,686.40	126,991.86	10%	质保金	陈子凡	业主方优先保障执行中项目付款，此笔可后续逐步回收。
13	国外项目	马来西亚木屑颗粒仓（含安装）	2023/11/9	11,050,418.12	374,151.12	3%	质保金	司斌	项目安装完成，未投产，因本工程前序来料及后续发放系统未建立，项目带料试运行未做，无法回款。
14	国外项目	拉法基孟加拉装载机输送系统项目	2023/11/9	321,196.90	321,175.60	3%	质保金	-	
15	国外项目	蒙古MAK2*700T水泥仓+3*110磨前仓项目	2024/3/6	326,570.40	854,188.92	10%	质保金	陈子凡	待开具质保保函后支付
		合计			12,284,956.65				
1	国内项目	广东罗定仓顶输送升级改造工程	2022/9/6	2,254,006.00	112,700.30	5%	质保金	-	挂靠项目，余质保金未收
2	国内项目	山东国材8座高岭土筒仓	2023/3/2	2,100,000.00	360,000.00	17%	验收款，质保金	李永祥	
3	国内项目	大悟陶粒及石膏粉包装输送设备	2023/5/6	4,700,000.00	235,000.00	5%	质保金	李永祥	
4	国内项目	朴玛（上海）辅料存储及配伍系统	2023/8/31	14,020,000.00	1,402,000.00	10%	质保金	李永祥	
5	国内项目	国能包头水泉露天煤矿储煤场装车筒仓	2023/12/4	3,472,500.00	104,175.00	3%	质保金	李永祥	
6	国内项目	安琪酵母粮食仓储卸粮及出料设备采购	2024/3/6	6,208,880.00	620,888.00	10%	竣工款，质保金	李永祥	挂靠项目，到账后应全额转付宜都华迅环保，李永祥申请
7	国内项目	中国电建华东院三亚石料矿项目筒仓	2024/3/15	10,673,500.00	4,269,400.00	40%	进度款，验收款，质保金	李永祥	年底前验收付至90%，目前现场未投产
8	国内项目	青山印尼2*2300T生石灰仓及配套设备项目	2024/6/21	6,950,000.00	695,000.00	10%	质保金	李永祥	
		合计			7,799,163.30				



公司标准化流程搭建

➤ 已完成以下进展：激励制度（项目“组织协同奖金包”激励方案、品牌宣传与外部活动参与激励制度）已定稿，并完成发布；展会管理、签证管理、信用证管理、项目竣工影像留存管理四项已完成访谈、文件编制，待定稿，本周完成汇报及定稿工作；货物包装管理、公司差旅费报销管理已完成访谈，文件编制中。施工单位招标管理、物资流转管理、变更管理待启动。

序号	重点事项	配套文件	当前进展
1	激励制度	项目“组织协同奖金包”激励方案	已定稿，并完成发布
		品牌宣传与外部活动参与激励制度	
2	展会管理	展会管理制度	已完成访谈，已完成文件编制和讨论，待定稿
		展会管理作业指导书	
3	签证管理	签证管理制度	已完成访谈，已完成文件编制和讨论，待定稿
		签证管理作业主导书	
4	信用证管理	信用证管理制度	已完成访谈，已完成文件编制，待讨论定稿
		信用证管理作业主导书	
5	项目竣工影像留存管理	项目竣工影像留存管理办法	已完成访谈，已完成文件编制，待讨论定稿
6	施工单位招标管理	施工单位招标管理制度	待访谈
		施工单位招标管理作业主导书	
7	货物包装管理	不同货物包装规范指引	已完成访谈，文件编制中
8	公司差旅费报销管理	报销管理制度	已完成访谈，文件编制中
		报销作业主导书	
9	物资流转管理	物资流转管理制度	待访谈
		物资流转管理作业主导书	
10	变更管理	变更管理制度	待访谈
		变更管理作业主导书	



其他事项



- 近期入职新员工较多，如业务部**陈磊、赵翠翠、王闯**，技术部**王林海**（技术顾问）、**张宝德**，品牌部**宗思宇**（实习生），希望相关部门负责人及业务组长帮助新员工尽快熟悉公司环境、快速掌握岗位技能、尽快融入团队，早日具备独立工作能力，形成团队战斗力。
- 近期公司**外宣活动**密集，为公司积极造势，其中，近一个月密集参加了四个展会：**越南水泥展**（5月27日-28日）、**澳门展会**（6月10日至12日）、**非洲加纳水泥展**（6月15日至17日）、**链博会**（6月22日-6月26日），本周**品牌运营部**将集中组织**展后复盘会**，复盘展会**组织效果及业务员获客情况**；同时，近期密集参加论坛，为公司积极发声：**第17届国际基础设施投资与建设高峰论坛**（发言人：温总）、**2026年APEC工商领导人中国论坛**（发言人：温总）、**2026年上合组织投资商务论坛**（发言人：温总）、**第四届链博会-《构建面向全球的绿色供应链》论坛**（发言人：温总），同时，公司已出台**《品牌宣传与外部活动参与激励制度》**，再次希望各部门负责人及员工积极参加外部论坛及推介演讲，投身到公司品牌宣传活动中去。



谢谢观看
T H A N K S
